



生产建设单位水土保持设施验收意见表

验收单位名称	厦门泰地石油化工有限公司		
项目名称	厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程		
项目位置	厦门市海沧区厦门港海沧港区海海岸线中部		
行业主管部门（或主要投资方）	厦门泰地石油化工有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复文号和时间	厦水许（2012）36 号，2012 年 5 月 31 日		
建设起止时间	2014 年 8 月 20 日~2025 年 11 月		
验收时间	2025 年 11 月		
方案设计的水土保持措施	工程措施	①泥浆沉淀池 <u>3</u> 个（尺寸：底宽 1.5m，深 1.5m，顶长 4m，坡比 1: 1.25，M7.5 浆砌片石衬砌厚 30cm）； ②砖砌排水沟 <u>2550</u> m（尺寸：底宽 0.4m×深度 0.4m，壁厚 12cm，沟底比降 0.5%）； ③浆砌沉沙池 <u>2</u> 座（尺寸：长 2.5m，宽 2.3m，深 1.5m，采用矩形结构，壁厚 30cm）； ④围墙 <u>1400</u> m（尺寸：宽 0.24m，高 1.7m，砖砌结构）； ⑤土地整治 <u>1.00</u> hm ² 。 以上工程措施投资估算 <u>57.33</u> 万元。	
	植物措施	①景观绿化（面积 <u>1.00</u> hm ² ，种植夹竹桃 458 株，台湾相思 458 株，铺种马尼拉草皮 5510m ² ）； ②抚育工程 <u>1.00</u> hm ² 。 以上植物措施投资估算 <u>11.05</u> 万元。	
	临时措施	①护栏长度 <u>60</u> m； ②铺彩条布面积 <u>3060</u> m ² ； ③砖砌排水沟 <u>225</u> m（尺寸：底宽 0.3m×深度 0.3m，壁厚 12cm，矩形断面）； ④表土覆盖 <u>0.3</u> 万 m ³ ； ⑤砖砌沉沙池 <u>1</u> 座（尺寸：长 2m，宽 1.5m，深 1m，壁厚 12cm，矩形断面，一级沉沙，砖砌结构）； ⑥填土编织袋挡墙 <u>217</u> m（尺寸：长 0.6m，装土后厚度 0.2m，宽 0.3m，33 袋/m ³ ），方量 238.7m ³ 。）； 以上临时措施投资估算 <u>17.82</u> 万元。	



	管理措施	1、土石方施工过程避开雨季，减少水土流失的产生； 2、土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途撒落土石方； 3、项目所需砂石材料向当地合法料厂单位采购； 4、加强水土保持宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识； 5、加强植物措施的后期抚育和管护，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。
实际完成的水土保持措施	工程措施	①泥浆沉淀池 <u>5</u> 个（尺寸：底宽 1.5m，深 1.5m，顶长 4m，坡比 1: 1.25，M7.5 浆砌片石衬砌厚 30cm）； ②砖砌排水沟 <u>4306</u> m（尺寸：底宽 0.4m×深度 0.4m，壁厚 12cm，沟底比降 0.5%）； ③围墙 <u>2104</u> m（尺寸：宽 0.24m，高 1.7m，砖砌结构） ④土地整治 <u>0.9168</u> hm ² 。 以上工程措施投资估算 <u>88.86</u> 万元。
	植物措施	①景观绿化（面积 <u>0.9168</u> hm ² ，种植乔木：油橄榄 1 株、锦叶榄仁 12 株、丛生木槿 4 株、火山榕 81 株，种植灌木：绣球花 4.9m ² ，金叶石菖蒲 2.1m ² ，紫雪茄花 17.1m ² ，百子莲 1.1m ² ，巴西野牡丹 3.6m ² ，长春花 2.4m ² ，细叶芒 3.2m ² ，蓝雪花 2.5m ² ，佛甲草 0.6m ² ，肾蕨 2.6m ² ，铺种马尼拉草皮 9168m ² 。） ②抚育工程 <u>0.9168</u> hm ² 以上植物措施投资估算 <u>14.85</u> 万元。
	临时措施	①护栏长度 <u>60</u> m； ②铺彩条布面积 <u>8000</u> m ² ； ③砖砌排水沟 <u>225</u> m（尺寸：底宽 0.3m×深度 0.3m，壁厚 12cm，矩形断面）； ④表土覆盖 <u>0.28</u> 万 m ³ ； ⑤砖砌沉沙池 <u>1</u> 座（尺寸：长 2m，宽 1.5m，深 1m，壁厚 12cm，矩形断面，一级沉沙，砖砌结构）； ⑥填土编织袋挡墙 <u>217</u> m（尺寸：长 0.6m，装土后厚度 0.2m，宽 0.3m，33 袋/m ³ ），方量 238.7m ³ 。）； ⑦洗车台 1 座(素砼 C20，尺寸：7.0m×4.5m) ⑧三级沉淀池 1 座（砖砌结构，尺寸：4.0m×2.0m×1.5m） 以上临时措施投资估算 <u>19.64</u> 万元。
	管理措施	在相应的“□”内打“√” ☒ 土石方调配情况符合水保方案要求 ☒ 多余土石方其他项目综合利用 ☒ 土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途撒落土石 ☒ 采用商品混凝土减少施工场地占地 ☐ 保留植被较好区域林草植被，减少扰动土地面积 ☒ 避开雨季施工，减少水土流失 ☐ 其他：



其他需要说明的情况	无
后续管护要求	本项目水土保持设施运行情况良好，景观绿化覆盖率达标，能够起到较好的水土保持作用。水土保持验收后，水土保持设施后续的管护主体为建设单位，建设单位应委托专人对已建水土保持设施的管理与维护（对雨水管网、砖砌排水沟及时进行维护，对景观绿化苗木进行抚育，修剪等），以发挥其长远效益。
验收结论	该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，目前运行情况良好，能够起到较好的水土保持作用，完成了水土流失预防和治理任务，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 验收组成员单位： 生产建设单位（签字及盖章） 厦门泰地石油化工有限公司  水土保持方案编制单位（签字） 福州绿岛环境科技有限公司  主体工程设计单位（签字） 浙江省天正设计工程有限公司  中交第一航务工程勘察设计院有限公司  水土保持设施施工单位（签字） 中化二建集团有限公司  中交第三航务工程局有限公司  水土保持设施监理单位（签字） 上海东华建设管理有限公司  天津市特种设备工程建设监理有限责任公司  2025 年 11 月 13 日

填表说明：

1. “项目位置”栏应准确至镇（街）、村（居）。
2. “水土保持方案批复文号和时间”栏如有涉及方案变更审批，需一并填写批复文号和
时间。
3. 水土保持具体措施内容可根据项目实际情况适当调整。
4. 验收组成员单位需填写单位全称及参加验收人员签字；参加单位可根据实际情况增
加。
5. 本表需加盖验收主持单位骑缝章。



项目现场图



综合楼现状



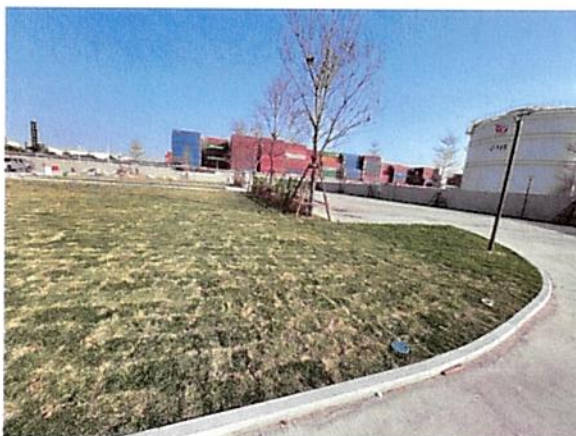
储罐区现状



生产区道路现状



砖砌雨水沟现状



办公区绿化现状



生产区绿化现状



厦门港海沧港区11#液体化工码头泊位工程

时间: 2025-11-14

项目 厦门港海沧港区11#液体化工码头泊位工程

项目类型 交通类-涉水交通工程

建设单位 厦门泰地石油化工有限公司

编制单位 厦门泰地石油化工有限公司

监测单位 /

地理位置 福建省厦门市海沧区

说明 根据《加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《厦门市水利局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（厦水利[2018]11号）的规定要求，项目已按照批复水土保持方案的要求完成了水土保持设施的建设工作，符合水土保持设施验收的条件。建设单位于2025年11月14日组织主体工程设计单位、施工单位、监理单位等各参建单位开展水土保持设施自主验收会议，同意水土保持设施通过验收并形成《生产建设项目水土保持设施验收意见表》、《水土保持设施验收会议纪要》。

特此公示！

附件

附件1: 1. 水土保持设施验收意见表.docx
附件2: 3. 水土保持设施验收会议纪要.docx
附件3: 4. 项目现场图.pdf

厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程水土保持设施自主验收报备申请函

(适用于生产建设项目水土保持方案报告书项目)

厦门市农业农村局:

根据生产建设项目水土保持设施自主验收的有关规定,厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程水土保持设施已建设完成,我单位组织召开验收会并完成了相关水土保持设施验收,验收结论为合格,自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 12 日在水土保持公示网(网址:<https://yanshou100.com>)公示了相关验收材料,对于公众反映的问题和意见,我单位已及时予以处理和解答。厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程于 2012 年 5 月取得水土保持方案报告书批复(厦水许(2012)36 号),现将本项目生产建设单位水土保持设施验收意见表、验收公示佐证材料和验收会议纪要等材料送贵局报备。

我单位郑重承诺:报备材料及信息均真实、准确、可靠,所有材料上的签名、印章均真实有效,若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况,我单位愿承担一切法律责任。

联系人及电话:

附件:1、生产建设单位水土保持设施验收意见表。

2、验收公示佐证材料。

3、验收会议纪要。

生产建设单位:厦门泰地石油化工有限公司(盖章)



生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请表

(适用于生产建设项目水土保持方案报告书项目)

生产建设单位	厦门泰地石油化工有限公司
生产建设项目	厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程
验收日期	2025 年 11 月 13 日
公示网站（或地点）、 起止时间、公示情况	自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 12 日在水土保持公示网(网址: https://yanshou100.com) 公示了相关验收材料, 对于公众反映的问题和意见, 我单位已及时予以处理和解答。
报备材料及 其编制单位	1. 生产建设单位水土保持设施验收意见表。 2. 验收公示佐证材料。 3. 验收会议纪要。 我单位郑重承诺: 以上报备材料及信息均真实、准确、可靠, 所有材料上的签名、印章均真实有效, 若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况, 我单位愿承担一切法律责任。 生产建设单位: 厦门泰地石油化工有限公司 (盖章) 2025 年 12 月 12 日 
联系人及电话	甘世其 15959355525

范兴森 13276060500 安全总监

注: 自 2023 年 3 月 1 日起, 承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构。对上述单位此前已签订水土保持设施验收报告编制技术服务合同的, 可由上述单位继续承担。

厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程

水土保持设施验收会议纪要

会议时间：2025 年 11 月 13 日

会议地点：项目部会议室

参会人员和参建单位：详见附件验收组成员签字表

会议主题：水土保持设施验收

纪要内容：

2025 年 11 月 13 日下午，由厦门泰地石油化工有限公司组织水土保持方案编制单位、主体工程设计单位、施工单位、监理单位等各参建单位召开厦门港海沧港区 11#液体化工码头泊位工程水土保持设施自主验收会议，与会人员经过核对施工图纸、勘察现场、查阅相关资料及研究讨论后各参加会议代表发表验收意见，形成以下会议纪要：

一、已完成水土保持措施工程量情况：

工程措施：泥浆沉淀池 5 个（ $4\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ ），砖砌排水沟 4306 m（ $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$ ），围墙 2104 m，土地整治 0.9168hm^2 ，表土覆盖 0.28 万 m^3 ；

植物措施：景观绿化 0.9168hm^2 ；

临时措施：护栏长度 60m，铺彩条布面积 8000m^2 ，砖砌排水沟 225m（ $0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$ ），砖砌沉沙池 1 座（ $2\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1\text{m}$ ），填土编织袋挡墙 217m，洗车台 1 座（ $7.0\text{m} \times 4.5\text{m}$ ）；三级沉淀池 1 座（ $4.0\text{m} \times 2.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ ）。



二、施工单位自评意见

施工单位已按批复的水土保持方案要求和有关规范、标准等要求完成施工，施工过程中水土保持工程质量控制资料基本齐全，外观、实测项目均符合设计要求。故对本工程水土保持设施自评为合格，提请有关单位进行验收。

三、监理单位自评意见

施工过程中，监理单位认真抓好工程质量监控，确保水土保持工程质量目标的实现，工程水土保持设施已按要求完成施工，外观、实测项目均符合设计及施工规范要求，未发现较大质量缺陷，对该工程水土保持设施质量评定为合格。

四、其余各方发表验收意见：

建设单位：同意验收。

主体工程设计单位：同意验收。

水土保持方案编制单位：同意验收。

五、会议总结






各参建单位验收人员一致通过水土保持设施验收，并形成《生产建设单位水土保持设施验收意见表》。

厦门泰地石油化工有限公司

2025年11月13日



附件：验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长		厦门泰地石油化工有限公司	副总		建设单位
成员		厦门泰地石油化工有限公司	经理		建设单位
	张娟	浙江省天正设计工程有限公司	高工		设计单位 (库区)
	龙晓馨	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	高工		设计单位 (码头)
	马钰	中化二建集团有限公司	高工		施工单位 (库区)
	林艺红	中交第三航务工程局有限公司	工程师		施工单位 (码头)
	肖金国	上海东华建设管理有限公司	总监		监理单位 (码头)
	王刚	天津市特种设备工程建设监理有限责任公司	总监		监理单位 (库区)
	王世铎	福州绿岛环境科技有限公司	工程师		水土保持 方案编制 单位

